

13. 05. 2011

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK - 825 18 Bratislava
IČO : 17317282
Direkcia TG
Oblasť JUH-Nitra
PJ Trenčín, Brnianska 2, 911 05 Trenčín

IČ DPH: SK2020316298 DIČ:2020316298
Tel. +421 (32)649 16 38
Fax. +421 (32)649 16 37
e-mail: iveta.michnova@strabag.com
www.strabag.sk
Bank.spoj.: 1423110003/1111

STRABAG

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 991/B

Str. : 1

FAKTÚRA č. 1190460007 (daňový doklad)

Odberateľ :

Mesto Stará Turá
SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Dátum dodania tovaru/služby : 30.04.2011

Dátum vyhotovenia : 12.5.2011

Forma úhrady : Prev. príkazom

Dátum splatnosti : 11.8.2011

IČO: 312002 DIČ: 2020381990
Č. účtu: 2721484251/0200

Podľa priloženého súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu Vám fakturujeme za stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 2010/HB/01/013 na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej":

Zdaniteľné plnenie	Sadzba (%)	Množstvo	Cena/M.j.	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
stavebné práce	20	1	134 057,75	134 057,75	26 811,55	160 869,30 €

Základ dane :	Základ dane :	134 057,75	Základ dane :	134 057,75
Daň 0%:	Daň 20%:	26 811,55	DPH:	26 811,55

K úhrade s DPH v EUR 160 869,30 €

Preddavok 0,00 €

Ostáva k úhrade EUR : 160 869,30 €

Prílohy: Zisťovacie protokoly o vykon.stav.prác
Krycie listy čerpania
Súpis prác

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(71)

NÁKL.STREDISKO: 810/HBBG
Vystavil: ING. MICHNOVÁ IVETA, TEL. +421 32 6491638

KRYCÍ LIST

Názov stavby: Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej
 Názov objektu:
 Názov časti:
 (Empty box)

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Projektant: HAKOM s r.o.
 Zhotoviteľ: STRABAG s r.o.

IČO: 312002
 IČ DPH: 2020381990
 17317282
 SK2020316298

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Ing. Anton Boc


Dňa: 6.5.2011
 Položiek:
 (Empty box)

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 9705,37	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 124352,38	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 134057,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 134057,75	
Pečiatka				24 20 % DPH 26811,55	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 160869,30	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa 0	
Dátum a podpis 06-05-2011				27 Kľúčová doložka 0	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0	



STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO :	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	134 057,75	134 057,75
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	134 057,75	134 057,75

VYHLÁSENIE



Podpísaný svojím podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011



STRABAG
STRABAG s. r. o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR

REKAPITULÁCIA - Súpis prác Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 30.4.2011
Projektant: HAKOM s.r.o.
Spracoval: Ing. Varga Radovan

Apríl 2011



Kód	Popis	2	3	4	5	6	7
		Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 20%	Cena s DPH	Cena bez DPH	
	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	559 498,28	0,00	111 899,66	671 397,94	134 057,75	
1	SO 01 Rekonštrukcia komunikácií	158 942,83	0,00	31 788,57	190 731,40	16858,85	
2	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	178 833,56	0,00	35 766,71	214 600,27	31947,69	
2.1	SO 02.1 - Chodník pri dome služieb	4 814,89	0,00	962,98	5 777,87	4814,89	
2.2	SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68	3 983,98	0,00	796,80	4 780,78	3984,00	
2.3	SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)	15 425,82	0,00	3 085,12	18 510,74	9751,01	
2.4	SO 02.4 - Pešia zóna	92 288,59	0,00	18 457,72	110 746,31	38948,38	
2.5	SO 02.5 - Chodník	59 782,52	0,00	11 956,50	71 739,02	24449,41	
2.6	SO 02.6 - Spevnená plocha	2 537,96	0,00	507,59	3 045,55	0,00	
3	SO 03 - Autobusový záliv	12 418,39	0,00	2 483,68	14 902,07	1083,83	
4	SO 04 - Mosty a lávky	64 902,33	0,00	12 980,47	77 882,80	13561,28	
5	SO 06 Verejná osvetlenie	144 401,17	0,00	28 860,23	173 261,40	20606,10	
5.1	SO 06.1 - Verejná osvetlenie - výstavba nového	118 582,89	0,00	23 716,58	142 299,47	15914,51	
5.2	SO 06.2 Verejná osvetlenie - rekonštrukcia	25 818,28	0,00	5 163,66	30 981,94	4691,59	
	Celkom	559 498,28	0,00	111 899,66	671 397,94	134 057,75	

Odsúhlasil:

p. Bahniková

Vypracoval:

S. Varga



STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKE NIVY 61/A
 82518 BEGAĽSKÁVA/SR
 070

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia komunikácie	EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 16858,85	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 16858,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 16858,85
Objednávateľ		24	20 % DPH 3371,77
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 20230,62
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Klízať doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 019
82518 BRATISLAVA, SR
(71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo: **STRABAG s. r. o.**
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblasť sever
 EB Žilina
 IČO : 17 317 282 IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Názov a sídlo: **Mesto Stará Turá**
 SNP 1/2
 916 01 Stará Turá
 Nadriadený orgán:
 IČO : 312002 IČ DPH: 2020381990

STAVBA

Názov stavby: **"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"**
 Číslo stavby: **810/HBBG**
 Názov fakturačného celku/objektu/:
 Miesto stavby: Stará Turá Kraj: Trenčiansky Okres:
 Zmluva o diele č: **2010/HB/01/013** Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	16 858,85	16 858,85
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	16 858,85	16 858,85

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:

STRABAG
 STRABAG S. R. O.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA / SR
 6.5.2011


Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011





Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia komunikácií

Časť:
 JKSO:


Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena celkom	April 2011	
			3	4									10	13
D			HSV		Práce a dodávky HSV			158 942,83						
D			1		Zemné práce			44 218,66						
1	K	PK	113107222		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	2 708,910	2,88	7 801,66	20,0				
2	K	PK	113107231		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	2 708,910	5,57	15 088,63	20,0				
3	K	PK	113107242		Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	2 708,910	5,66	15 332,43	20,0	2708,910	15 332,43 €		
4	K	PK	113202111		Výrbanie obrub, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	213,300	1,94	413,80	20,0	213,300	413,80 €		
	D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			10 220,09						
29	K	PK	916561111		Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	27,600	7,32	202,03	20,0				
30	M	MAT	5921745300		Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	27,600	2,33	63,48	20,0				
31	K	PK	917832111		Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	456,500	8,85	4 040,03	20,0				
32	M	MAT	5921745000		Obrubník betónový cesný 150/260/1000	Kus	456,500	4,09	1 867,09	20,0				
33	K	PK	918101111		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžobných kociek z betónu prostého tr. B12.5 (zn.II)	m3	60,335	0,59	35,60	20,0				
34	K	PK	979081111		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1 767,340	0,42	742,28	20,0	490,313	205,93 €		
35	K	PK	979081121		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 371,379	0,18	2 226,85	20,0	3430,000	617,40 €		
36	K	PK	979081121.R		Poplatok za skládku stavebnej suty (skládka Kostolíné)	t	1 277,027	0,59	753,45	20,0				
37	K	PK	979081122.R		Poplatok za skládku suty - živice (skládku Kostolíné)	t	490,313	0,59	289,28	20,0	490,313	289,28 €		
	D		99		Presun hmôt HSV			3 587,05						
38	K	PK	998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľžobným (822 2.3, 822 5.3) ako akelikovek diažky objektu	t	3 039,877	1,18	3 587,05	20,0				
Celkom:												158 942,83	16 858,85 €	



Vypracoval:

Odsúhlasil: p. Bahniková



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO02 Codníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.1 - Chodník pri dome služieb	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	HAKOM s r.o.	312002	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1285,58	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 3529,32	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4814,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 4814,89
Objednávateľ		24	20 % DPH 962,98
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 5777,87
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0

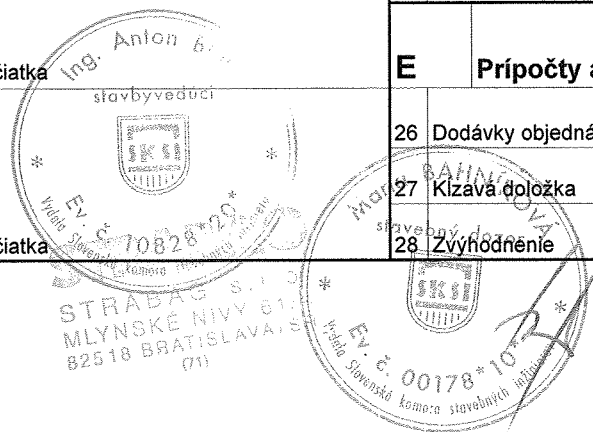

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obce

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo: **STRABAG s. r. o.**
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Vykonávajúci závod/správa, divízia: Oblasť sever
 EB Žilina
 IČO : 17 317 282 IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Názov a sídlo: **Mesto Stará Turá**
 SNP 1/2
 916 01 Stará Turá
 Nadriadený orgán:
 IČO : 312002 IČ DPH: 2020381990

STAVBA

Názov stavby: **"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"**
 Číslo stavby: **810/HBBG**
 Názov fakturačného celku/objektu:
 Miesto stavby: Stará Turá Kraj: Trenčiansky Okres:
 Zmluva o diele č: **2010/HB/01/013** Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁČE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	4 814,89	4 814,89
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	4 814,89	4 814,89

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:



Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Staršej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.1 - Chodník pri dome služieb
 JKSO:


Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

April 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk.	Cena jednotk.	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D			HSV	Práce a dodávky HSV				4814,89			
D		1		Zemné práce				1137,63			
1	K	PK	121101001	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	11,424	35,25	402,70	20	11,424	402,70 €
2	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hromine 3 do 100 m3	m3	22,848	3,19	72,89	20	22,848	72,89 €
3	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach d0 100 m3	m3	9,141	1,59	14,53	20	9,141	14,53 €
4	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	688,840	0,94	647,51	20	688,840	647,51 €
D		5		Komunikácie				2437,88			0,00 €
5	K	PK	564861111	Podklad zo štrkordny s rozprestretím a zhutnením po zhlutnení hr. 200 mm	m2	114,240	3,28	374,71	20	114,240	374,71 €
6	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	114,240	9,09	1038,44	20	114,240	1 038,44 €
7	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	114,240	8,97	1 024,73	20	114,240	1 024,73 €
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1087,69			0,00 €
8	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	113,410	7,32	830,16	20	113,410	830,16 €
9	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	113,410	2,30	260,84	20	113,410	260,84 €
10	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	11,341	0,59	6,69	20	11,341	6,69 €
D		99		Presun hmôt HSV				141,69			0,00 €
11	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	120,078	1,18	141,69	20	120,078	141,69 €
								4814,89			4 814,89 €

Odsúhlasil p. Bahniková

Vypracoval:



STRABAG
 STRABAG s. r. o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 82518 BRATISLAVA/SR
 (7)

KRYCÍ LIST


Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			IČ DPH
			2020381990
			SK2020316298
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1207,1309	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 2776,87	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 3984,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 3984,00	
Pečiatka				24 20 % DPH 796,80	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 4780,80	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa 0	
Dátum a podpis 06-05-2011				27 Klzáva doložka 0	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0	



STRABAG s r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 1
 825 18 BRATISLAVA, SLOVAKIA
 (71)



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obce

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo: **STRABAG s. r. o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblasť sever

EB Žilina

IČO : 17 317 282

IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Názov a sídlo: **Mesto Stará Turá**
SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Nadriadený orgán:

IČO : 312002

IČ DPH: 2020381990

STAVBA

Názov stavby: **"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"**

Číslo stavby: **810/HBBG**

Názov fakturačného celku/objektu/:

Miesto stavby: Stará Turá

Kraj: Trenčiansky

Okres:

Zmluva o diele č: **2010/HB/01/013**

Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	3 984,00	3 984,00
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	3 984,00	3 984,00

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



STRABAG
STRABAG s. r. o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA - SR

Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

April 2011

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba		Cena celkom
									DPH	Množstvo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	9
Práce a dodávky HSV											
D	D		HSV					3983,98			
D	D		1	Zemné práce				937,04			
1	K	PK	113107143	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316	m2	106,376	7,50	797,82	20	106,376	797,82
2	K	PK	113204111	Výrhanie obrúb, s vyburaním lôžka, záhonových 0,040 t	m	67,540	0,97	65,51	20	67,540	65,51
3	K	PK	121101001	Odstánenie ornice ručne s vodorov, premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	1,969	35,25	69,41	20	1,969	69,41
4	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	2,702	1,59	4,30	20	2,702	4,30
5	D		5	Komunikácie				2185,52	20		0,00
5	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm	m2	115,820	0,81	93,81	20	115,820	93,81
6	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	115,820	9,09	1052,80	20	115,820	1052,80
7	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	115,820	8,97	1038,91	20	115,820	1038,91
8	K	PK	916561111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	67,540	7,32	494,39	20	67,540	494,39
9	M	MAT	5921745300	Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou oporou	kus	67,540	2,23	155,34	20	67,540	155,34
10	K	PK	917832111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	3,150	8,85	27,88	20	3,150	27,88
11	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	Kus	3,150	4,09	12,88	20	3,150	12,88
12	K	PK	918101111	Obrubník betónový cestný 150/250/1000	m3	7,069	0,59	4,17	20	7,069	4,17
13	K	PK	979081111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	t	36,316	0,42	15,25	20	36,316	15,25
14	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	254,215	0,18	45,76	20	254,215	45,76
15	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej suti (skládku Kostolné)	t	2,702	0,59	1,59	20	2,702	1,59
16	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku suti - živice (skládku Kostolné)	t	33,615	0,59	19,83	20	33,615	19,83
D	D		99	Presun hmôt HSV				84,33	20		0,00
17	K	PK	99823011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822.2.3. 822.5.3) sklejčiek dlžky objektu	t	71,468	1,18	84,33	20	71,468	84,33
								3983,98			3.984,00

Odsúhlasila p. Bahniková

Vypracoval:



STRABAG
 STRABAG S. R. O.
 MLYNSKE NIVY 61/A
 82510 BRATISLAVA SR (71)

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.	IČ DPH	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		17317282
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2902,462	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 6848,55	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 9751,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9751,01

24 20 % DPH 1950,20



25 **Cena s DPH (r. 23-24) 11701,21**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kľúčová doložka 0

28 Zvýhodnenie 0



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo: **STRABAG s. r. o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblast' sever
EB Žilina
IČO : 17 317 282 IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Názov a sídlo: **Mesto Stará Turá**
SNP 1/2
916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:
IČO : 312002 IČ DPH: 2020381990

STAVBA

Názov stavby: **"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"**
Číslo stavby: **810/HBBG**
Názov fakturačného celku/objektu/:
Miesto stavby: Stará Turá Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: **2010/HB/01/013** Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	9 751,01	9 751,01
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	9 751,01	9 751,01

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011




STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA, SR
(71)

Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej miestkej zóny v Starej Turí
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotkov		Satzba DPH	Cena celkom	
						Množstvo	7		8	9
Práce a dodávky HSV									15425,62	
D	D		1	Zemné práce					2736,94	
1	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m2	432,386	5,57	20	2408,39	2 408,39 €
2	K	PK	113204111	0,225 t	m	169,940	0,97	20	164,84	164,84 €
3	K	PK	132201201	Vyrbanie obrúb, s vybráním lôžka, záhonových 0,040 t	m3	2,244	5,77	20	12,95	0,00 €
4	K	PK	174101001	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	2,244	2,84	20	6,37	0,00 €
5	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	8,106	1,59	20	12,89	0,00 €
6	K	PK	175101101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtíet, rýh, zárezov v týchto vykoppávkach 40	m3	0,150	20,70	20	3,11	0,00 €
7	K	PK	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,150	0,59	20	0,09	0,00 €
8	K	PK	181301101	Pripjatok k cene za prehodenie sypaniny	m2	136,490	0,94	20	128,30	0,00 €
9	K	PK	451572111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	0,150	4,13	20	4,13	0,00 €
10	K	PK	596912112	Vodorovné konštrukcie	m3	432,386	27,53	20	4,13	0,00 €
11	M	MAT	5922913200	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m2	432,386	9,09	20	3930,39	2 545,20 €
12	K	PK	871353121	Komunikácie	m2	432,386	8,97	20	3878,50	2 511,60 €
13	M	MAT	2861103300	Rúrové vedenie	m	1,360	0,73	20	0,99	0,00 €
14	K	PK	916561111	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	kus	1,000	22,68	20	22,68	0,00 €
15	M	MAT	5921745300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,9x2000	m	169,940	7,32	20	1243,96	1 243,96 €
16	K	PK	918101111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	kus	169,940	2,30	20	390,86	390,86 €
17	K	PK	935112111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m3	20,594	0,59	20	12,15	12,15 €
18	M	MAT	5922933400	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	m	36,000	20,77	20	747,72	0,00 €
19	M	MAT	5922934100	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	kus	36,000	26,55	20	955,80	0,00 €
20	M	MAT	5922935000	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	kus	1,000	71,69	20	71,69	0,00 €
21	K	PK	979081121	Odvodňovacie doplnky - Zberná vpusť 500/250/690	kus	104,084	0,42	20	43,72	43,72 €
22	K	PK	979081121	Odvodňovacie doplnky - prekrýtie Rošt-mreža 1000/236	t	728,591	0,18	20	131,15	131,15 €
23	K	PK	979081121	Odvov sutiny a vybráňaných hmôt na skládku do 1 km	t	104,084	0,59	20	61,41	61,41 €
24	K	PK	996229011	Odvov sutiny a vybráňaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	201,470	1,18	20	237,73	237,73 €
				Pripjatok za skládku stavebnej sute (skládka Kostolná)						
				Presun hmôt HSV						
				Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3)						
				akejkoľvek dĺžky objektu						
									15425,62	9751,01 €



Vypracoval: *[Signature]*

Odsúhlasia p. Bahniková

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.4 - Pešia zóna	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.	IČ DPH	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	17317282	SK2020316298
	Ing. Anton Boc	Dňa	6.5.2011
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	828	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0	
2	Montáž	38120,38	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0	
3	PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0	
4	Montáž		11	16	Prevádzkové vplyvy	0	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	0	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)	38948,38	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0	
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	38948,38
		24	20 % DPH	7789,68
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	46738,05
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis	06-05-2011	27	Kľzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie	0



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo: **STRABAG s. r. o.**
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblast' sever
 EB Žilina
 IČO : 17 317 282 IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Názov a sídlo: **Mesto Stará Turá**
SNP 1/2
916 01 Stará Turá
 Nadriadený orgán:
 IČO : 312002 IČ DPH: 2020381990

STAVBA

Názov stavby: **"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"**
 Číslo stavby: **810/HBBG**
 Názov fakturačného celku/objektu/:
 Miesto stavby: Stará Turá Kraj: Trenčiansky Okres:
 Zmluva o diele č: **2010/HB/01/013** Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	38 948,38	38 948,38
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	38 948,38	38 948,38

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:



Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum: 6.5.2011



Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.4 - Pešia zóna
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

April 2011


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D			HSV	Práce a dodávky HSV				92288,59			
D			1	Zemné práce				28938,04			
1	K	PK	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm 0,235t	m ²	1369,110	2,88	3943,04	20	1369,110	3 943,04 €
2	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m ²	1439,970	5,57	8020,63	20	1439,970	8 020,63 €
3	K	PK	113107242	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	237,910	5,66	1346,57	20	237,910	1 346,57 €
4	K	PK	113107243	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² ,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	1369,110	10,21	13978,61	20	1369,110	13 978,61 €
5	K	PK	113202111	Vyrhnanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	165,760	1,94	321,57	20	165,760	321,57 €
6	K	PK	113204111	Vyrhnanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	260,555	0,97	252,74	20	260,555	252,74 €
7	K	PK	121101001	Odstánenie omnice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m ³	9,696	35,25	341,78	20	9,696	341,78 €
8	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopyky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m ³	m ³	16,395	3,19	52,30	20	16,395	52,30 €
9	K	PK	181301101	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	724,260	0,94	680,80	20	724,260	680,80 €
10	K	PK	564851114	Komunikácie	m ²	1369,110	2,95	4038,87	20	1369,110	4 038,87 €
11	K	PK	564861111	Podklad zo širokdvyní s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m ²	109,300	3,28	358,50	20	109,300	358,50 €
12	K	PK	567135112	Podklad z prostého betónu hr.B 10 hr.170 mm	m ²	1369,110	14,04	19222,30	20	1369,110	19 222,30 €
13	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	1645,500	9,09	14957,60	20	1645,500	14 957,60 €
14	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m ²	276,390	8,37	2479,22	20	276,390	2 479,22 €
15	M	MAT	5922913300	Zámková dlažba hr. 80 mm	m ²	1369,110	13,03	18000,63	20	1369,110	18 000,63 €
16	K	PK	916561111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	406,355	7,32	2974,52	20	360,000	2 635,20 €
17	M	MAT	5921745300	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	kus	406,355	2,30	934,62	20	360,000	828,00 €
18	K	PK	918101111	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	m ³	40,636	0,59	23,98	20	36,000	21,24 €
19	K	PK	979081111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého hr. B12.5 (zn.II)	t	1155,892	0,42	485,47	20	1155,892	485,47 €
20	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8091,244	0,18	1456,42	20	8091,244	1 456,42 €
21	K	PK	979081121.R	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	680,192	0,59	401,31	20	680,192	401,31 €
22	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku stavebnej suty (skládky Kostolné)	t	475,700	0,59	280,66	20	475,700	280,66 €
			99	Poplatok za skládku suty - živice (skládky Kostolné)	t	1936,45		1936,45	20	1936,45	0,00 €
			99	Presun hmôt HSV							
			99	stavebn. Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)							
23	K	PK	998223011	akékoľvek dižky objektu	t	1641,060	1,18	1936,45	20	201,470	237,73 €
								92288,59			38 948,38 €



STRABAG s. r. o.
 Mesto Stará Turá
 Pešia zóna

[Handwritten signature]

Vypracoval:



Odsúhlasil p. Bahniková

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.5 - Chodník	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			IČ DPH
			2020381990
			SK2020316298
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	3482,2	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0	
2	Montáž	20967,21	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0	
3	PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0	
4	Montáž		11	16	Prevádzkové vplyvy	0	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	0	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)	24449,41	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0	
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			24449,41
Pečiatka				24 20 % DPH			4889,88
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			29339,29
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			0
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka			0
06-05-2011				28 Zvýhodnenie			0



STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 6
 82518 BRATISLAVA
 (70)



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblasť sever	
EB Žilina	
IČO : 17 317 282	IČ DPH: SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990


STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	24 449,41	24 449,41
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	24 449,41	24 449,41


VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc



Podpis: Dátum: 6.5.2011



Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková



Podpis: Dátum: 6.5.2011

Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.5 - Chodník

JKSO:



Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotkovo			Sadzba	Množstvo		Cena celkom
						7	8	9		10	7	
April 2011												
D			HSV	Práce a dodávky HSV				59782,52				
D			1	Zemné práce				13433,66				
1	K	PK	113107221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm 0,130 t	m2	789,210	2,88	2272,92	20	789,210	2 272,92 €	
2	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	789,210	5,57	4395,90	20	789,210	4 395,90 €	
3	K	PK	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	1088,270	5,66	6159,61	20	1088,270	6 159,61 €	
4	K	PK	113204111	Vyfrhanie obrub, s vyburaním lôžka, záhonových 0,040 t	m	292,000	0,97	283,24	20	292,000	283,24 €	
5	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopy nezapážené s prehod. do 3 m alebo nalož. v horline 3 do 100 m3	m3	63,499	3,19	202,56	20	63,499	202,56 €	
6	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	42,829	1,59	68,10	20	42,829	68,10 €	
7	K	PK	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	54,610	0,94	51,33	20	54,610	51,33 €	
8	D		5	Komunikácie				21171,59				
8	K	PK	564801111R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení	m3	0,968	16,05	15,54	20	0,968	15,54 €	
9	K	PK	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 160 mm	m2	764,680	2,62	2003,46	20	764,680	2 003,46 €	
10	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1060,130	9,09	9636,58	20	1060,130	9 636,58 €	
11	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	1058,160	8,97	9491,70	20	1058,160	9 491,70 €	
12	M	MAT	5922912900	Dlažba pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	1,970	12,34	24,31	20	1,970	24,31 €	
13	K	PK	916161111.R	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	166,500	56,64	9430,56	20	166,500	9 430,56 €	
14	M	MAT	5922923300	Osadenie cestnej obrubky z palisád do lôžka z betónu	kus	925,000	7,99	7353,75	20	925,000	7 353,75 €	
15	K	PK	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	643,800	7,32	4712,62	20	643,800	4 712,62 €	
16	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	643,800	2,30	1480,74	20	643,800	1 480,74 €	
17	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obrubky z dlažbových kociek z betónu prostého hr. B12,5 (zn.II)	m3	81,030	0,59	47,81	20	81,030	47,81 €	
18	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	488,826	0,42	205,31	20	488,826	205,31 €	
19	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3421,785	0,18	615,92	20	3421,785	615,92 €	
20	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej suty (skládku Kostolné)	t	291,850	0,59	172,19	20	291,850	172,19 €	
21	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku suty - živice (skládku Kostolné)	t	196,977	0,59	116,22	20	196,977	116,22 €	
22	K	PK	998223011	Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822.2.3, 822.5.3) Prekážok pre objekt	t	883,175	1,18	1042,15	20	883,175	1 042,15 €	
											59782,52	24 449,41 €

Odsúhlasil p. Bahniková

Vypracoval:

STRABAG s. r. o.
 MLYNSKE NIVY 61/A
 82510 BRATISLAVA / SR
 (71)



KRYCÍ LIST

Názov stavby: Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej
 Názov objektu: SO 03 Autobusový záliv
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Projektant: HAKOM s.r.o.
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

IČO: 312002
 IČ DPH: 2020381990
 17317282
 SK2020316298

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Ing. Anton Boc

Dňa: 6.5.2011
 Položiek:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	1083,83	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0
4		Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		1083,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ			Pečiatka		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ			Pečiatka		
Dátum a podpis			Pečiatka		
23	Súčet 7, 12, 19-22				1083,83
24	20 %	DPH			216,77
25	Cena s DPH (r. 23-24)				1300,59
E Prípochy a odpočty					
26	Dodávky objednávateľa				0
27	Kľúčová doložka				0
28	Zvýhodnenie				0

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 617
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (71)



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obce

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo: **STRABAG s. r. o.**
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblasť sever
 EB Žilina
 IČO : 17 317 282 IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Názov a sídlo: **Mesto Stará Turá**
SNP 1/2
916 01 Stará Turá
 Nadriadený orgán:
 IČO : 312002 IČ DPH: 2020381990

STAVBA

Názov stavby: **"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"**
 Číslo stavby: **810/HBBG**
 Názov fakturačného celku/objektu/:
 Miesto stavby: Stará Turá Kraj: Trenčiansky Okres:
 Zmluva o diele č: **2010/HB/01/013** Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	1 083,83	1 083,83
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	1 083,83	1 083,83

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:

6.5.2011


Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



STRABAG
 STRABAG s. r. o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA - SR

Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 03 - Autobusový závil
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk		Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo		Cena
						7	8				10	11	
D			HSV	Práce a dodávky HSV					12418,39				
D			1	Zemné práce					2204,33				
1	K	PK	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	24,000	2,37	56,88	24,000	20	24,000	56,88 €	
2	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	119,400	7,50	895,50	119,400	20	119,400	895,50 €	
3	K	PK	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	8,102	140,42	1137,68	8,102	20	8,102	0,00 €	
4	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	m3	35,820	3,19	114,27	35,820	20	35,820	0,00 €	
D			5	Komunikácie					5463,42				
5	K	PK	564871111.R	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm	m2	119,400	4,92	587,45	119,400	20	119,400	0,00 €	
6	K	PK	565161021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 80 mm	m2	119,400	14,88	1776,67	119,400	20	119,400	0,00 €	
7	K	PK	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	119,400	0,52	62,09	119,400	20	119,400	0,00 €	
8	K	PK	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II tr. jemnozrnný (ABJ, ABS, ABH) hr. 60mm (červený asfalt)	m2	143,400	21,18	3037,21	143,400	20	143,400	0,00 €	
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4580,93				
9	K	PK	917832111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	45,240	8,85	400,37	45,240	20	45,240	0,00 €	
10	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový cestný 150/250/1000	Kus	45,240	4,09	185,03	45,240	20	45,240	0,00 €	
11	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	9,324	0,59	5,50	9,324	20	9,324	0,00 €	
12	K	PK	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	48,000	3,53	169,44	48,000	20	48,000	0,00 €	
13	K	PK	935112111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	48,000	20,77	996,96	48,000	20	48,000	0,00 €	
14	M	MAT	5922933400	Odvodňovacie žlab	kus	48,000	26,55	1274,40	48,000	20	48,000	0,00 €	
15	M	MAT	5922934100	Odvodňovacie doplnky - Zberná vpusť 500/250/690	kus	2,000	71,69	143,38	2,000	20	2,000	0,00 €	
16	M	MAT	5922935000	Odvodňovacie doplnky - prekrýtie Rošt-mreža 1000/236	kus	48,000	26,55	1274,40	48,000	20	48,000	0,00 €	
17	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	57,907	0,42	24,32	57,907	20	57,907	24,32 €	
18	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	405,348	0,18	72,96	405,348	20	405,348	72,96 €	
19	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku suite - živice (skládku Kostolné)	t	17,824	0,59	10,52	17,824	20	17,824	10,52 €	
20	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku suite - živice (skládku Kostolné)	t	40,082	0,59	23,65	40,082	20	40,082	23,65 €	
D			99	Presun hmôt HSV					169,71				
21	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dlžky objektu	t	143,825	1,18	169,71	143,825	20	143,825	0,00 €	
									12418,39				
									2204,33				
									1093,83 €				

CELKOM

Odsúhlasil: p. Bahníková

Vypracoval:

STRABAG S.R.O.
 MYNSKEJ AVY BVA
 82515 BRATISLAVA SF
 (71)



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Mosty a lávky	EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo		IČ DPH
			2020381990
	Spracoval		
	Ing. Anton Boc		
		Dňa	Položiek
		6.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0	
2	Montáž	13561,28	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0	
3	PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0	
4	Montáž		11	16	Prevádzkové vplyvy	0	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	0	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)	13561,28	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0	
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			13561,28
Pečiatka				24 20 % DPH			2712,26
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			16273,54
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			0
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka			0
06-05-2011				28 Zvýhodnenie			0



STRABAG S. I. S.
MLYNSKÉ NIVY 63
825 18 BRATISLAVA
(71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obč mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/: Oblasť sever	
EB Žilina	
IČO : 17 317 282	IČ DPH: SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	13 561,28	13 561,28
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	13 561,28	13 561,28

VYHLÁSENIE



Podpísaný svojím podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis: Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis: Dátum: 6.5.2011




Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Objekt: SO 04 - Mosty a lavky
Cast:

JKSO:

Objednávatel: Mesto Stará Tura
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Dátum: 30.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk.	Cena jednotko.	Cena celkom	Sádzba DPH	Apríl 2011	
										Množstvo	Cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				64902,33			
	D	1		Zemné práce				13148,93			
1	K	PK	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm	m2	386,732	2,37	916,55	20	386,732	916,55
2	K	PK	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm	m2	745,188	10,21	7608,37	20	745,188	7608,37
3	K	PK	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	30,367	140,42	4264,13	20	30,367	4264,13
4	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	m3	112,814	3,19	359,88	20	112,814	359,88
	D	5		Komunikácie				36262,82	20		0,00
5	K	PK	564871111.R	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnutí 300 mm	m2	413,035	4,92	2032,13	20	413,035	0,00
6	K	PK	567115111.R	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr. 70 mm	m2	386,732	5,78	2235,31	20	386,732	0,00
7	K	PK	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr. 100 mm	m2	745,188	8,26	6155,25	20	745,188	0,00
8	K	PK	573211111	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1131,920	0,52	588,60	20	1131,920	0,00
9	K	PK	577151213	Betón asfaltový po zhutnutí II.tr. jemnozrnný (ABJ, ABS, ABH) hr. 60mm (červený asfalt)	m2	619,400	21,18	13118,89	20	619,400	0,00
10	K	PK	577151213.R	Betón asfaltový po zhutnutí II.tr. jemnozrnný (ABJ, ABS, ABH) hr. 60mm (čierny asfalt)	m2	126,122	13,03	1643,37	20	126,122	0,00
11	K	PK	577171225	Betón asfaltový po zhutnutí II.tr. jemnozrnný (ABJ, ABS, ABH) hr. 80mm (červený asfalt)	m2	347,200	28,25	9808,40	20	347,200	0,00
12	K	PK	577171225.R	Betón asfaltový po zhutnutí II.tr. jemnozrnný (ABJ, ABS, ABH) hr. 80mm (čierny asfalt)	m2	39,198	17,37	680,87	20	39,198	0,00
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				146648,49	20		0,00
13	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	17,800	0,59	10,50	20	17,800	0,00
14	K	PK	935112111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	178,000	20,77	3697,06	20	178,000	0,00
15	M	MAT	5922933400	Odvodňovacie žľab	kus	178,000	26,55	4725,90	20	178,000	0,00
16	M	MAT	5922934100	Odvodňovacie doplnky - Zberná vpusť 500/250/690	kus	10,000	71,69	716,90	20	10,000	0,00
17	M	MAT	5922935000	Odvodňovacie doplnky - prekrytie Rošt-mreža 1000/236	kus	178,000	26,55	4725,90	20	178,000	0,00
18	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	340,187	0,42	142,88	20	340,187	142,88
19	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2381,306	0,18	428,64	20	2381,306	428,64
20	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej sutie (skládka Kostolné)	t	66,807	0,59	39,42	20	66,807	39,42
21	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku suti + živice (skládka Kostolné)	t	273,379	0,59	161,29	20	273,379	161,29
	D	99		Presun/hmot HSV				842,09	20		0,00
22	K	PK	998225111	Presun/hmot pre požernú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	713,637	1,18	842,09	20	713,637	0,00
Celkom									54902,33	13 561,28	13 561,28



Vypracoval: *[Signature]*

Odsúhlasil: p. Bahniková

KRYCÍ LIST

Názov stavby: Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej
 Názov objektu: SO 06 Verejné osvetlenie
 Názov časti: SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Projektant: HAKOM s r.o.
 Zhotoviteľ: STRABAG s r.o.

IČO: 312002
 IČ DPH: 2020381990
 17317282
 SK2020316298

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Ing. Anton Boc

Dňa: 6.5.2011
 Položiek:
 6.5.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 15914,51	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 15914,51	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15914,51

24 20 % DPH 3182,90

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** 19097,41

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kľúčová doložka 0

28 Zvýhodnenie 0



STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 82518 BRATISLAVA/ŠA
 (71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obce

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever
EB Žilina	
IČO : 17 317 282	IČ DPH: SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	15 914,51	15 914,51
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	15 914,51	15 914,51

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa

Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



Za objednávateľa

Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011





Súpis prác - April 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 06 Verejné osvetlenie
 Časť: SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

				April 2011								
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotk	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	K	PK	Pol1	94600001 - Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 30 cm. Vybranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, uvedenie do pôvodného stavu.	m	30,000	26,02	780,60	20	30,000	780,60 €	
2	K	PK	Pol2	94600002 - Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v diaľže, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, pokládka novej diaľžby, uvedenie do pôvodného stavu	m	299,000	23,86	7134,14	20	50,000	1 193,00 €	
3	K	PK	Pol3	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	313,000	13,65	4272,45	20	313,000	4 272,45 €	
4	K	PK	Pol4	94600006 - Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou, chránička \varnothing 100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm	m	20,000	47,40	948,00	20	20,000	0,00 €	
5	K	PK	Pol5	94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít.	m	790,000	2,32	1832,80	20	290,000	672,80 €	
6	K	PK	Pol6	svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn \varnothing =10 mm	m	12,000	2,32	27,84	20	12,000	27,84 €	
7	K	PK	Pol7	94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn \varnothing =10 mm2, vrátane podružného materiálu	m	790,000	1,34	1058,60	20	300,000	402,00 €	
8	K	PK	Pol8	94600046 - Chránička káblová ohybná, spevnená, priemeru 65 mm, FXDU-65	m	790,000	0,78	616,20	20	300,000	234,00 €	
9	K	PK	Pol9	94600047 - Zatahovanie kábla CYKY-J 4x10 do chráničky priemeru 65 mm	m	383,000	0,90	344,70	20	283,000	254,70 €	
10	K	PK	Pol10	94600048 - Chránička káblová ohybná, spevnená, priemeru 50 mm FXDU-50	m	383,000	0,68	260,44	20	283,000	192,44 €	
11	K	PK	Pol11	94600049 - Zatahovanie kábla 1XDMX + 3x2,5 do chráničky priemeru 50 mm	ks	120,000	32,85	3942,00	20		0,00 €	
12	K	PK	Pol12	94600159 - Ocelová chránička, žiarovo pozinkovaná so závitom pre veľmi vysoké mechanické zaťaženie (4000N/5cm) priemeru 50mm. Štandardná dĺžka 3m, vrátane podružného materiálu.	ks	13,000	13,67	177,71	20		0,00 €	
13	K	PK	Pol13	94600160 - Kolená so závitom žiarovo pozinkované 90° priemeru 50mm vrátane podružného materiálu	ks	4,000	57,75	231,00	20		0,00 €	
14	K	PK	Pol14	94600161 - Ocelová ohybná chránička pre vysoké mechanické zaťaženie (1250N) s vnútornou izolačnou vrstvou priemeru 50mm, vrátane podružného materiálu. Balenie po 25m	m	738,000	0,78	573,64	20		0,00 €	
15	K	PK	Pol15	94600162 - Zatahovanie kábla CGSSG-J 3x2,5 do ocelevej rúry priemeru 50mm.	ks	3,000	17,83	53,49	20	3,000	53,49 €	
16	K	PK	Pol16	94600163 - Ocelová chránička, žiarovo pozinkovaná so závitom pre veľmi vysoké mechanické zaťaženie (>4000N/5cm) priemeru 25mm. Štandardná dĺžka 3m, vrátane podružného materiálu.	ks	15,000	0,50	7,50	20	15,000	7,50 €	
17	K	PK	Pol17	94600164 - SS príchytky žiarovo zinkované pre oceleové rúry priemeru 25mm, montáž 2 skrutky priemeru 4mm.	ks	2,000	4,32	8,64	20	2,000	8,64 €	
18	K	PK	Pol18	94600165 - Kolená so závitom žiarovo pozinkované 90° priemeru 25mm vrátane podružného materiálu	m	220,000	26,02	5724,40	20	115,000	2 992,30 €	
19	K	PK	Pol19	94600166 - Výkop v asfalte do hĺbky 100mm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, pokládka guľatiny, uvedenie do pôvodného stavu.	m	8,000	46,47	371,76	20		0,00 €	
20	K	PK	Pol20	94600037 - Základ pre zemné svietidlo s odtokom kondenzovanej vody	ks	27,000	70,76	1910,52	20		0,00 €	
21	K	PK	Pol21	94600058 - Hliníkové montážne púzdro s kytím pre montáž zemného LED svietidla do zeme, chodníku s odtokom kondenzovanej vody.	m	48,000	33,50	1608,00	20		0,00 €	
22	K	PK	Pol22	94600059 - Základ pre LED pásk vyrobený z hliníku typ:S4 OPAL, kod:10011, max. dĺžka do 2000mm, rozmery: 15,2x6mm	ks	30,000	26,78	803,40	20		0,00 €	
				94600060 - Hliníkové montážne púzdro so servisným krytom, h=90mm	ks	30,000	26,78	803,40	20		0,00 €	



STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ JIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SF



23	K	PK	Poi23	34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	790,000	3,85	3041,50	20	300,000	1 155,00 €
24	K	PK	Poi24	34600072 - Kábel Hybrid Cable Compact, 1xDIMX + 3x2,5 mm ² , PVC, Black	m	383,000	14,35	5496,05	20	210,000	3 013,50 €
25	K	PK	Poi25	34600073 - Kábel s gumovou izoláciou CGSG-J 4x6	m	51,000	3,62	184,62	20	51,000	184,62 €
26	K	PK	Poi26	34600074 - Kábel s gumovou izoláciou CGSG-O 2x1,5	m	52,000	0,89	46,28	20	12,000	10,68 €
27	K	PK	Poi27	34600075 - Kábel s gumovou izoláciou CGSG-J 3x2,5	m	738,000	1,31	966,78	20	224,000	293,44 €
28	K	PK	Poi28	34600076 - Inštalčná plastová krabica IP67 pod zemné LED svetidlo, rozmery: 25/4,5/6cm	ks	2,000	11,21	22,42	20		0,00 €
29	K	PK	Poi29	34600077 - Rozbočovacia plastová krabica ACEDUR pod zemné svetidlo	ks	1,000	3,15	3,15	20		0,00 €
30	K	PK	Poi30	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidiel pred montážou.	ks	105,000	5,89	618,45	20		0,00 €
31	K	PK	Poi31	40000035 - Montáž zemného svetidla. Zatesnenie svetidla tak, aby voda nevnikla do svetidla.	ks	111,000	61,34	6808,74	20		0,00 €
32	K	PK	Poi32	40000038 - Revízia svetidla	mer.	113,000	3,72	420,36	20		0,00 €
33	K	PK	Poi33	40000083 - Zemné svetidlo TARGETTI, typ: icare Compact asymetrické pre vysokotlakovú halogenidovú výbojku 35W	ks	8,000	759,51	6076,08	20		0,00 €
34	K	PK	Poi34	40000100 - Svetidlo TARGETTI, typ: PHOENIX SOFT RGB 3W RGB,IP67	ks	27,000	511,09	13799,43	20		0,00 €
35	K	PK	Poi35	40000102 - Nove svetidlo LED pásk typu FLEXA WW, kod:G0009, 4.8W/m, IP68 rozmery:180x68x53mm, 5A, IP67.	m	48,000	21,00	1008,00	20		0,00 €
36	K	PK	Poi36	40000104 - Napätový zdroj na napájanie LED modulov typ: ZDR N 60W 12V,	ks	4,000	26,25	105,00	20		0,00 €
37	K	PK	Poi37	40000105 - Svetidlo do zeme (Guzzini LEDPLUS, 3x1W LED biela, IP68, 230V s rozptylným filtrom (matná fólia)	ks	30,000	367,50	11025,00	20		0,00 €
38	K	PK	Poi38	40000106 - Zemné svetidlo od firmy TARGETTI typ: 1E1756 ICARE 3x50W + prstenec s krycím sklom, čierna + prstenec pre montáž zarovno s terenom, čierny	ks	46,000	645,65	29699,90	20		0,00 €
39	K	PK	Poi39	40000107 - Osadené vysokovýkonové LED moduly od výrobcu CREE, typ LXA 3W MR16W, 2700K	ks	138,000	21,00	2898,00	20		0,00 €
40	K	PK	Poi40	35100007 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 35 W, 3400 lm, 12 000 hod.čira, G8.5, 3000 K, keramický horák	ks	8,000	26,25	210,00	20		0,00 €
41	K	PK	Poi41	35200002 - Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	113,000	6,13	692,69	20	27,000	165,51 €
42	K	PK	Poi42	35200003 - Počítacia revízia stožiaru s jedným svetidlom	x	113,000	14,82	1674,66	20		0,00 €
43	K	PK	Poi43	35300007 - Montáž RVO, základ z betónu, zapojenie vetiev, pripojenie vývodu, revízia, odskúšanie (do 6východov)	ks	1,000	786,92	786,92	20		0,00 €
44	K	PK	Poi44	35300027 - Murárske práce pri osadení rozvádzača	ks	1,000	61,19	61,19	20		0,00 €
45	K	PK	Poi45	35300063 - Rozvádzač ROM na osvetlenie mosta, osadenie na pilier ako voľne stojaci, vrátane jednopólového ističa a prúdového chrániča 10A/30mA.	ks	1,000	247,84	247,84	20		0,00 €
Celkom											
118582,89											
15 914,51 €											

Odsúhlasil: p. Bahniková

Vypracoval:



STRABAG
STRABAG S. R. O.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82510 BRATISLAVA/SR
(71)

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	SO 06.1 - Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.	IČ DPH	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 4691,59	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4691,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 4691,59
Objednávateľ		24	20 % DPH 938,32
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 5629,91
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľúčová doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



STRABAG
MLYNSKÉ NIV
82518 BRATISLAVA

06-05-2011

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO:	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky
	Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	4 691,59	4 691,59
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	4 691,59	4 691,59

VYHLÁSENIE


Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

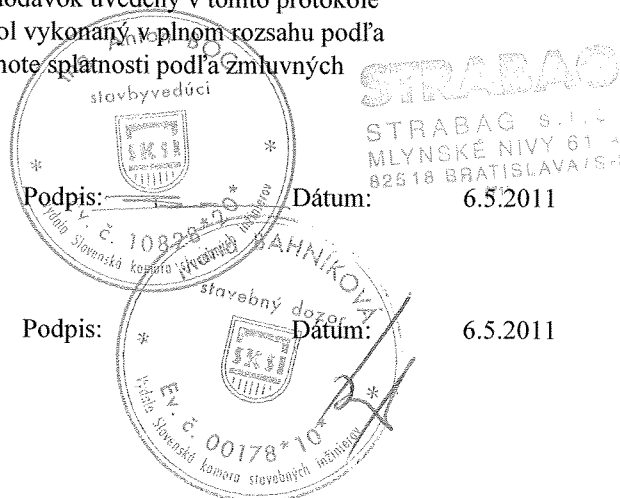

Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Objekt: SO 06 Verejné osvetlenie

Časť: SO 06.2 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia



JKSO:

Objednávatel': Mesto Stará Tura


Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 30.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk			Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba			Množstvo		Cena
						5	6	7			8	9	10	11	12	
			1	2										Apríl 2011		
1	K	PK	Pol46	21000001 - Demontáž parkového svetidla do výšky 4m, likvidácia	ks	1,000			10,85	10,85	20			1,000	10,85 €	
2	K	PK	Pol47	21000003 - Demontáž pouličného svetidla do výšky 8m, likvidácia	ks	7,000			12,39	86,73	20			7,000	86,73 €	
3	K	PK	Pol48	21000004 - Demontáž pouličného svetidla do výšky 10m, likvidácia	ks	1,000			12,39	12,39	20			1,000	12,39 €	
4	K	PK	Pol49	21000010 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	8,000			13,94	111,52	20			8,000	111,52 €	
5	K	PK	Pol50	21000020 - Demontáž betonových stožiarov do MH=8,0m, likvidácia	ks	1,000			179,69	179,69	20			1,000	179,69 €	
6	K	PK	Pol51	21000022 - Demontáž stožiarov do MH=4,0m, likvidácia	ks	1,000			58,86	58,86	20			1,000	58,86 €	
7	K	PK	Pol52	21000024 - Demontáž stožiarov do MH=8,0m, likvidácia	ks	7,000			58,86	412,02	20			7,000	412,02 €	
8	K	PK	Pol53	21000027 - Demontáž pátky parkovej plastovej (sklolaminát)	ks	1,000			13,94	13,94	20			1,000	13,94 €	
9	K	PK	Pol54	21000028 - Demontáž pátky cestnej plastovej (sklolaminát)	ks	7,000			17,04	119,28	20			7,000	119,28 €	
10	K	PK	Pol55	21000031 - Demontáž istiacej poistkovej skrinky na stožiar, likvidácia	ks	1,000			17,04	17,04	20			1,000	17,04 €	
11	K	PK	Pol56	21000032 - Demontáž svorkovnice	ks	8,000			9,29	74,32	20			8,000	74,32 €	
12	K	PK	Pol57	21000033 - Demontáž základu stožiara v zeleni do MH=4m, odvoz sutiny na skládku	ks	1,000			77,45	77,45	20			1,000	77,45 €	
13	K	PK	Pol58	21000034 - Demontáž základu stožiara v zeleni do MH=8m, odvoz sutiny na skládku	ks	7,000			108,43	759,01	20			7,000	759,01 €	
14	K	PK	Pol59	21000036 - Demontáž základu stožiara v chodníkoch - betón, asfalt do MH=10m, odvoz sutiny na skládku	ks	1,000			139,41	139,41	20			1,000	139,41 €	
15	K	PK	Pol60	21000045 - Demontáž starého,holého vzdušného vedenia VO	m	70,000			6,20	434,00	20			70,000	434,00 €	
16	K	PK	Pol6	94600010 - Dodávka Gufatíny FeZn 7=10 mm2, vrátane podružného materiálu	m	45,000			2,32	104,40	20			45,000	104,40 €	
17	K	PK	Pol61	94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprúžkový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m	ks	21,000			92,95	1951,95	20			21,000	1 951,95 €	
18	K	PK	Pol62	94600026 - Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 8 m	ks	9,000			179,69	1617,21	20			9,000	0,00 €	
19	K	PK	Pol63	34000002 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, typ STK 60/40/3	ks	21,000			168,00	3528,00	20			21,000	0,00 €	
20	K	PK	Pol64	34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	21,000			55,77	1171,17	20			21,000	0,00 €	
21	K	PK	Pol65	34000026 - Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	9,000			71,26	641,34	20			9,000	0,00 €	
22	K	PK	Pol66	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	30,000			15,18	455,40	20			30,000	0,00 €	



23	K	PK	Poi67	34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	30,000	1,39	41,70	20	0,00 €
24	K	PK	Poi68	34000043 - Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	30,000	4,03	120,90	20	0,00 €
25	K	PK	Poi69	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	30,000	0,47	14,10	20	0,00 €
26	K	PK	Poi70	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	30,000	0,30	9,00	20	0,00 €
27	K	PK	Poi71	34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2050SK-2D1U, 2x10A	ks	22,000	34,07	749,54	20	0,00 €
28	K	PK	Poi72	34000070 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2050SK-3D1U, 3x10A	ks	6,000	40,28	241,68	20	0,00 €
29	K	PK	Poi73	34000071 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2051SK-2D1S-1R, 2x10A + prúdový chránič PFI-2 B10A/0,03 s ističom 10kA umiestnený na posuvnú DIN-lištu	ks	2,000	85,31	170,62	20	0,00 €
30	K	PK	Poi74	34000072 - Stožiar hliníkový výložníkový typ SSC	ks	9,000	572,25	5150,25	20	0,00 €
31	K	PK	Poi75	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	216,000	0,47	101,52	20	0,00 €
32	K	PK	Poi76	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	180,000	0,47	84,60	20	0,00 €
33	K	PK	Poi77	34600025 - Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	240,000	0,68	163,20	20	0,00 €
34	K	PK	Poi78	40000002 - Cestné svetidlo s plochým sklom, s vysokotučným fazetovým optickým systémom n=92%, IP 65, pre sodíkovú vysokotlakovú výbojku 100/150 W (dvojbočková tlmivka), na výložník/driek stožiaru r 60/76mm. Svetidlo je vybavené elektronickým predradň	ks	9,000	171,47	1543,23	20	0,00 €
35	K	PK	Poi79	40000014 - Parkové hribové svetidlo pre sodíkovú/halogenidovú výbojku 100/150 W, IP 65, PC, E27, na driek stožiaru r60/76 mm	ks	21,000	152,25	3197,25	20	0,00 €
36	K	PK	Poi80	40000030 - Príruba pre svetidlo SR r=76mm	ks	9,000	11,76	105,84	20	0,00 €
37	K	PK	Poi30	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	30,000	5,89	176,70	20	0,00 €
38	K	PK	Poi81	40000033 - Montáž pouličného svetidla do 10 m	ks	9,000	10,85	97,65	20	0,00 €
39	K	PK	Poi82	40000036 - Montáž parkového svetidla do 6m	ks	21,000	10,22	214,62	20	0,00 €
40	K	PK	Poi32	40000038 - Revízia svetidla	mer.	30,000	3,72	111,60	20	0,00 €
41	K	PK	Poi83	35100008 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 70 W, 6500 lm, 12 000 hod.číra, E27, 3000 K, keramický horák	ks	21,000	29,40	617,40	20	0,00 €
42	K	PK	Poi84	35100010 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 100 W, 10000 lm, 12 000 hod.číra, E40, 3000 K, keramický horák	ks	9,000	33,60	302,40	20	0,00 €
43	K	PK	Poi41	35200002 - Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	30,000	6,13	183,90	20	128,73 €
44	K	PK	Poi42	35200003 - Počiatočná revízia stožiaru s jedným svetidlom	x	30,000	14,82	444,60	20	0,00 €
Celkom										
4 691,59 €										



vypracoval: *[Signature]*

STRABAG
STRABAG S. R. O.
MLYNSKE NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SR



Odsúhlasil: p. Bahníková
